

SAE 4.01
Développement d'une Application Complexe



Bâti'Parti

**Plan de Développement – Comparaison
prévisionnel / réalisé**

**COUPAT Baptiste
TAJER Ilyess
RACHIDI Adem
SCANU Esteban
DOISY Noa**

INFO2 - TD1 - TPH

Sommaire :

I) Stories.....	3
1. Liste des stories :.....	3
2. Dépendances :.....	5
3. État réel d'avancement des stories.....	5
II) Classer les stories.....	6
1. Valeur Utilisateurs :.....	6
2. Taille et complexité :.....	7
3. Classement des stories planifiés :.....	7
III) Tâches.....	8
1. Découpage et partage réel du temps :.....	8
A .Renforcement de la sécurité.....	8
B. Refonte de l'administration des utilisateurs.....	8
C. Intégration des factures d'artisans.....	9
D. Amélioration de l'IHM.....	9
E. Prise en charge de l'utilisateur artisan.....	10
F. Ordre de création forcé.....	10
G. Exportation au format CSV	11
2. Comparatif estimation / réalisé.....	11
3. Récapitulatif :.....	12
IV) Sprints.....	13
1. Déroulement réel des sprints.....	13
2. Calendrier réel.....	13
3. Stories et livrables réel.....	14
4. Trello final sprint 1:.....	15
5. Trello final sprint 2:.....	15
6. Trello final sprint 3:.....	16

I) Stories

1. Liste des stories :

A - Renforcement de la sécurité et déploiement

- Description : Refonte du stockage de l'utilisateur identifié et déploiement de l'application.
- Profils-types d'utilisateur de la fonction : Utilisateur connecté
- Début : Utilisateur souhaitant accéder à l'application.
- Fin : Utilisateur connecté et données stockées correctement.
- Paramètres : Identifiant de l'utilisateur, son mot de passe.

B - Refonte de l'administration des utilisateurs

- Description : Permet à l'administrateur de modifier le login ou le mot de passe d'un utilisateur (administrateur)
- Profils-types d'utilisateur de la fonction : un administrateur
- Début : L'administrateur souhaite modifier le login ou mot de passe d'un utilisateur.
- Fin : Données de l'utilisateur modifiées.
- Paramètres : nouveau login ou mot de passe d'un utilisateur.

C - Intégration des factures d'artisans

- Description : Permet aux maître d'oeuvre d'accéder aux factures des artisans (maître d'oeuvre)
- Profils-types d'utilisateur de la fonction : un maître d'oeuvre
- Début : Le maître d'oeuvre souhaite accéder aux factures d'un artisan pour un chantier.
- Fin : Le maître d'oeuvre accède aux factures.
- Paramètres : identifiant d'un chantier.

D - Amélioration de l'IHM

- Description : Améliorations de l'affichage et de la recherche de chantier, ajout du changement d'artisan dans la planification.
- Profils-types d'utilisateur de la fonction : un maître d'oeuvre, un commercial, un administrateur ou un artisan.

E - Prise en charge de l'utilisateur artisan

- Description : Permet aux artisans d'accéder à leur étapes affectées d'un chantier et y générer une facture (artisan).
- Profils-types d'utilisateur de la fonction : un artisan.
- Début : L'artisan connecté souhaite accéder à ses étapes d'un chantier pour générer une facture.
- Fin : La facture est générée et l'étape marquée comme finalisée.
- Paramètres : L'identifiant d'un chantier.

F - Ordre de création forcé

- Description : Empêche le maître d'oeuvre d'affecter des artisans ou de planifier un chantier qui n'est pas encore personnalisé (maître d'oeuvre).
- Profils-types d'utilisateur de la fonction : un maître d'oeuvre
- Début : Le maître d'oeuvre souhaite affecter des artisans ou planifier un chantier.
- Fin : Le maître d'oeuvre accède à ce qu'il cherche ou reçoit un message d'erreur si le chantier n'est pas planifié.
- Paramètres : L'identifiant d'un chantier.

G - Exportation au format CSV

- Description : Permet aux maître d'oeuvre d'exporter la liste des chantiers par artisan (maître d'oeuvre).
- Profils-types d'utilisateur de la fonction : un maître d'oeuvre.
- Début : Le maître d'oeuvre veut télécharger la liste des chantiers classés par artisan.
- Fin : Un fichier CSV est téléchargé.

H - Page profil utilisateur (Pas planifié de base)

- Description : Permet aux utilisateurs d'accéder à une page contenant leurs informations personnelles et permettant de modifier leur mot de passe.
- Profils-types d'utilisateur de la fonction : un utilisateur.
- Début : L'utilisateur veut accéder à ses données personnelles.
- Fin : L'utilisateur accède à la page profil.

I - Mot de passe oublié (Pas planifié de base)

- Description : Permet aux utilisateurs de modifier leur mot de passe sur la page de login si oubli.
- Profils-types d'utilisateur de la fonction : un utilisateur.
- Début : L'utilisateur a oublié son mot de passe et clique sur mot de passe oublié.
- Fin : Si l'utilisateur existe, il accède à une page grâce à un mail pour modifier son mot de passe.

2. Dépendances :

STORY	Nécessité
-------	-----------

A . Renforcement de la sécurité et déploiement	D, B, C, E, F, G
B. Refonte de l'administration des utilisateurs	D
C. Intégration des factures d'artisans	D
D. Amélioration de l'IHM	Aucune
E. Prise en charge de l'utilisateur artisan	D, C, F
F. Ordre de création forcé	D, C
G. Exportation au format CSV	E, D, C, F
H. Page profil utilisateur	Aucune
I. Mot de passe oublié	Aucune


3. État réel d'avancement des stories

Story	Prévue	Réalisée	Sprint prévu	Sprint réel	Commentaire
A. Renforcement de la sécurité	Oui	Oui	Sprint 3	Sprint 2	Terminée en avance
B. Refonte administration utilisateurs	Oui	Oui	Sprint 2	Sprint 2	Conforme à la prévision
C. Intégration des factures d'artisans	Oui	Oui	Sprint 1 et 2	Sprint 1 et 2	Conforme à la prévision
D. Amélioration de l'IHM	Oui	Oui	Sprint 1	Sprint 1	Conforme à la prévision
E. Prise en charge utilisateur artisan	Oui	Oui	Sprint 2 et 3	Sprint 2	Terminée en avance
F. Ordre de création forcé	Oui	Oui	Sprint 2	Sprint 2	Conforme à la prévision


G. Export CSV	Oui	Oui	Sprint 3	Sprint 3	Conforme à la prévision
H. Page profil utilisateur	Non	Oui	Non prévue	Sprint 3	Terminée en bonus
I. Mot de passe oublié	Non	Oui	Non prévue	Sprint 3	Terminée en bonus

II) Classer les stories

1. Valeur Utilisateurs :

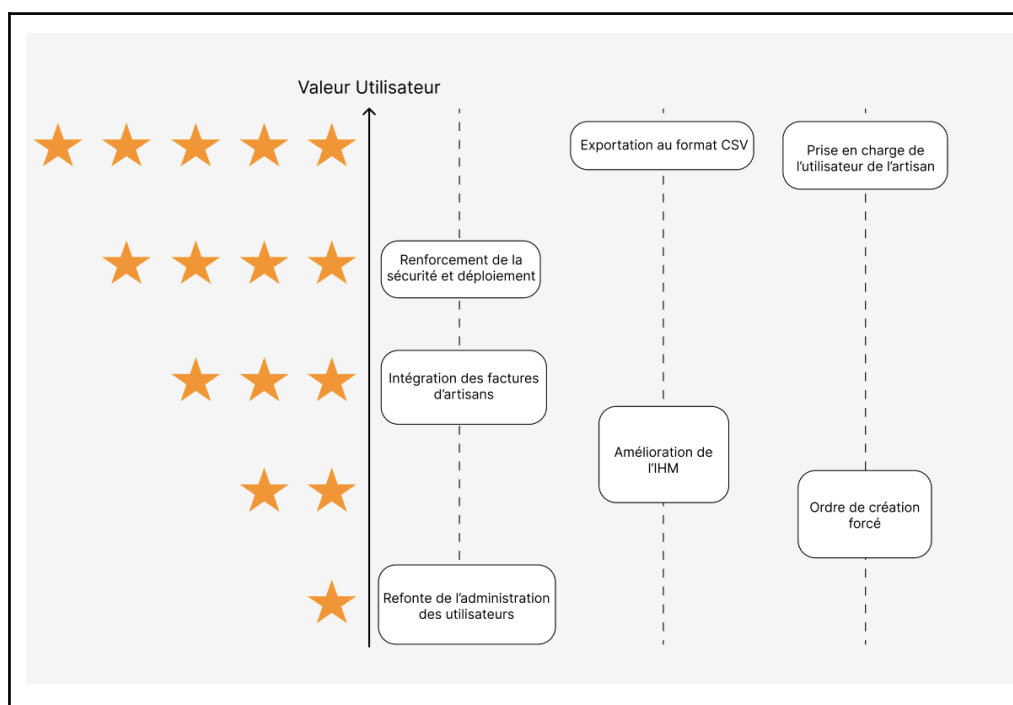

2. Taille et complexité :

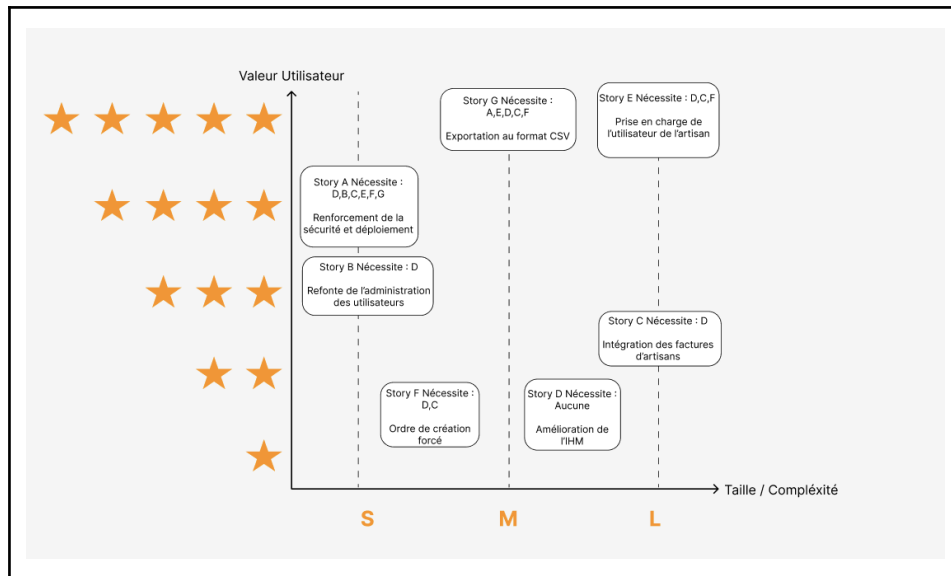

3. Classement des stories planifiés :

Rang	Story
1	D. Amélioration de l'IHM
2	C. Intégration des factures d'artisans
3	B. Refonte de l'administration des utilisateurs
4	F. Ordre de création forcé
5	E. Prise en charge de l'utilisateur artisan
6	G. Exportation au format CSV
7	A . Renforcement de la sécurité et déploiement

III) Tâches

1. Découpage et partage réel du temps :

A .Renforcement de la sécurité.

Tâche	Nombre d'heures estimées
IHM	5h
Base de Données	0h
Couche Métier	7h
Documentation	3h
Tests	2.5h
Debuggage	1h
Total	18.5h

Cette tâche ayant pris moins de temps que prévu, nous avons donc pu la terminer un sprint plus tôt, l'erreur de planification était due à une mauvaise première idée de raisonnement qui nous faisait utiliser la base de données.

B. Refonte de l'administration des utilisateurs.

Tâche	Nombre d'heures estimées
IHM	5.5h
Base de Données	1h
Couche Métier	4.5h
Documentation	2.5h
Tests	3h
Debuggage	1.5h
Total	18h

Cette tâche nous a pris le temps qu'il fallait, aucune anomalie dans notre planification.

C. Intégration des factures d'artisans.

Tâche	Nombre d'heures estimées
IHM	10h
Base de Données	1h
Couche Métier	9.5h
Documentation	3h
Tests	2.5h
Debuggage	3h
Total	29h

Pour cette tâche, nous avons un peu trop surestimé les demandes en IHM et en couche métier, à cause de cela nous l'avons finie bien trop tôt et avons donc pu avancer d'autres tâches.

D. Amélioration de l'IHM.

Tâche	Nombre d'heures estimées
IHM	7.5h
Base de Données	0h
Couche Métier	5.5h
Documentation	2.5h
Tests	2.5h
Debuggage	1.5h
Total	19.5h

Cette tâche nous a pris le temps qu'il fallait, aucune anomalie dans notre planification.

E. Prise en charge de l'utilisateur artisan.

Tâche	Nombre d'heures estimées
IHM	10h
Base de Données	3h
Couche Métier	7h
Documentation	3.5h
Tests	3h
Debuggage	2h
Total	28.5h

Pour cette tâche, nous avons surestimé la couche métier et les IHMs car nous pensions implémenter plus de fonctionnalités à cause d'une mauvaise compréhension du sujet, nous avons donc réussi à terminer cette tâche un sprint plus tôt.

F. Ordre de création forcé

Tâche	Nombre d'heures estimées
IHM	0.5h
Base de Données	1.5h
Couche Métier	6.5h
Documentation	1h
Tests	0.5h
Debuggage	0.5h
Total	10.5h

Cette tâche avait été trop surestimée, nous pensions devoir toucher à l'IHM alors que nous n'avons qu'à générer une erreur pour que l'utilisateur comprenne, alors nous l'avons terminée très tôt et donc pu continuer sur d'autres tâches.

G. Exportation au format CSV .

Tâche	Nombre d'heures estimées
IHM	5.5h
Base de Données	2h
Couche Métier	7h
Documentation	3h
Tests	2h
Debuggage	2.5h
Total	22h

Cette tâche nous a pris le temps qu'il fallait, aucune anomalie dans notre planification.

2. Comparatif estimation / réalisé

Les stories B, D et G ont été réalisées dans un temps proche de celui prévu. Elles ne présentent donc pas d'écart significatif entre l'estimation et le réalisé.

En revanche, les stories A, C, E et F ont finalement été réalisées en moins de temps que prévu. Pour la story A, l'écart d'exécution s'explique par notre croyance erronée qu'il fallait modifier la base de données, qui ne fut finalement pas nécessaire. Pour les stories C et E, l'IHM et la couche métier ont été considérées comme plus importantes alors qu'elles avaient été mal estimées lors de la phase d'évaluation du besoin. Enfin, pour la story F, nous pensions avoir à reconstruire plus l'interface alors qu'un message d'erreur aurait suffi.

Ces décalages sont venus, au contraire, renforcer la gestion de ce projet. En effet, la prise d'avance au sprint 2 a permis la finalisation, un sprint plus tôt que prévu, des stories A et E. Le sprint 3 permettant alors de se consacrer à la story G, mais également à l'ajout inespéré d'un deux fonctionnalités non prévues initialement, H. Page profil utilisateur et I. Mot de passe oublié.

Au total, ce comparatif montre donc que le projet a été mieux maîtrisé que ne l'évaluait dans la seconde moitié du développement.

3. Récapitulatif :

Story	Estimation initiale	Réalisé	Écart	Sprint prévu	Sprint réel
A. Renforcement de la sécurité	22h	18,5h	-3,5h	3	2
B. Refonte administration utilisateurs	18h	18h	0h	2	2
C. Intégration factures artisans	39h	29h	-10h	1-2	1-2
D. Amélioration de l'IHM	19.5h	19,5h	0h	1	1
E. Prise en charge utilisateur artisan	37.5h	28,5h	-9h	2-3	2
F. Ordre de création forcé	22h	10,5h	-11,5h	2	2
G. Export CSV	22h	22h	0h	3	3
H. Page profil utilisateur	Non prévue	22h	Ajout	Non prévue	3
I. Mot de passe oublié	Non prévue	12h	Ajout	Non prévue	3
Total	180h	180h	- 34h		

IV) Sprints

1. Déroulement réel des sprints

Sprint	Tâches Prévu	Tâches Réalisé	Commentaire
1	D + début C	D terminé + C avancée	Conforme à la prévision
2	fin C + B + F + début E	fin C + B + F + E terminée + A terminée	Avance importante
3	fin E + G + A	G + page profil (H) + mot de passe oublié (I)	Re-planification et ajout de nouvelles tâches grâce à l'avance

2. Calendrier réel


Sprint	Période prévue	Période réelle	Tâches prévu	Tâches réalisé
1	09/02/2026 au 09/03/2026	idem	D + partie de C	D terminée + partie de C
2	23/03/2026	idem	fin C + B + F + début E	fin C + B + F + E terminée + A réalisée

3	25/03/2026	idem	fin E + G + A	G + page profil(H) + mot de passe oublié(I)
---	------------	------	---------------	---


3. Stories et livrables réel

Sprint	Prévu	Réalisé	Livrables réels
1	D + début C	D + début C	amélioration IHM (D), Intégration des factures d'artisans(C)
2	fin C + B + F + début E	fin C + B + F + E + A	Intégration des factures d'artisans(C), refonte de l'administration des utilisateurs(B), ordre de forcé(F), prise en charge de l'utilisateur artisan(E), renforcement de la sécurité et déploiement(A)
3	fin E + G + A	G + page profil(H) + mot de passe oublié(I)	Exportation au format CSV(G), page profil(H), mot de passe oublié(I)

4. Trello final sprint 1:

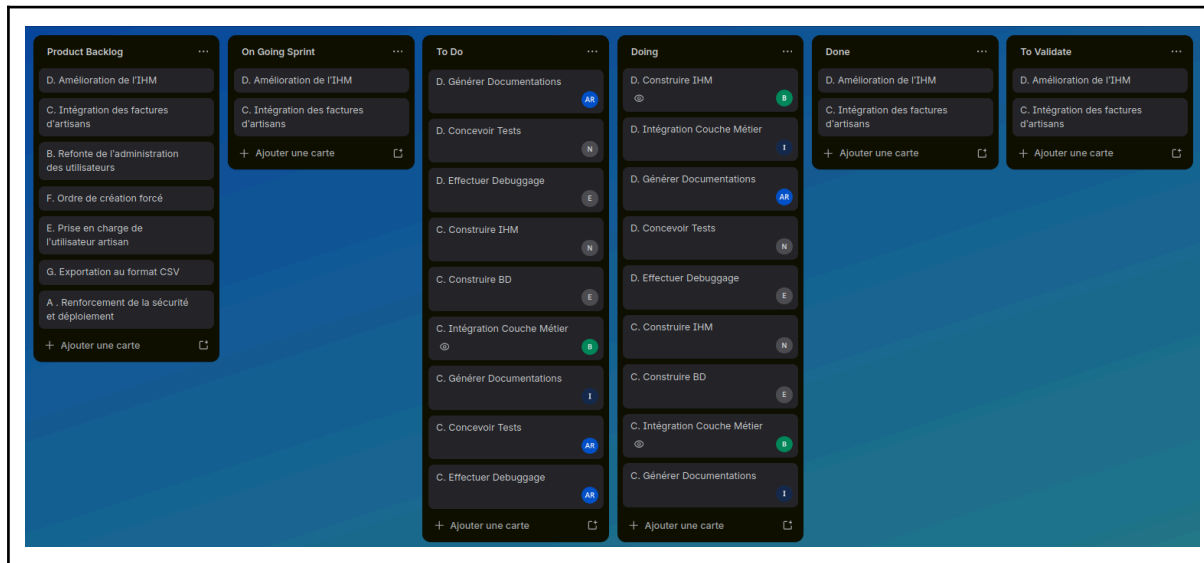

5. Trello final sprint 2:

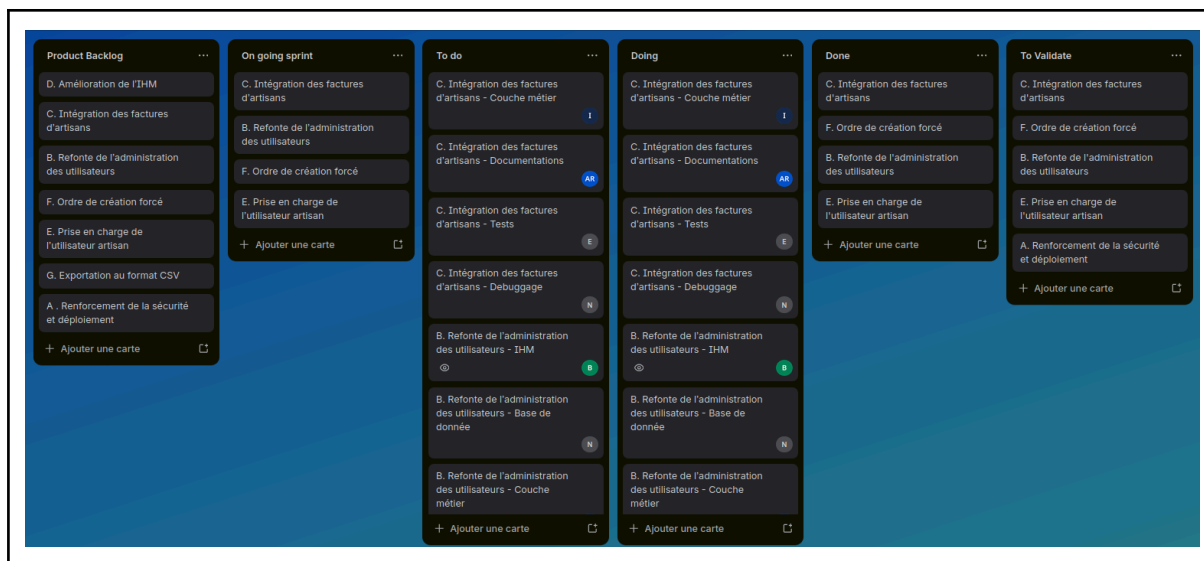

6. Trello final sprint 3:

