

SAE 3.01
Développement d'une Application



Bâti'Parti

Plan de Développement

COUPAT Baptiste

TAJER Ilyess

RACHIDI Adem

SCANU Esteban

DOISY Noa

INFO2 - TD1 - TPH

Sommaire :

I) Stories.....	4
1. Liste des stories :.....	4
2. Dépendances :.....	4
II) Classer les stories.....	5
1. Valeur Utilisateurs :.....	5
2. Taille et complexité :.....	5
3. Classement des stories :.....	6
III) Tâches.....	6
1. Découpage et estimation du temps :.....	6
A . Authentification Utilisateur.....	6
E. Création d'un chantier.....	7
C. Personnalisation des étapes.....	7
F. Planification des étapes.....	8
B. Affectation des artisans.....	8
D. Appels de fonds.....	9
G. Administration Base de Données.....	9
2. Récapitulatif :.....	10
IV) Sprints.....	11
1. Lots de tâches :.....	11
2. Calendrier :.....	13
3. Temps disponible par sprint :.....	14
4. Stories et livrables.....	14

I) Stories

1. Liste des stories :

- A - Authentification Utilisateur
- B - Affectation des artisans
- C - Personnalisation des étapes
- D - Appels de fonds
- E - Création d'un chantier
- F - Planification des étapes
- G - Administration Base de Données

2. Dépendances :


STORY	Nécessité
A . Authentification Utilisateur	Aucune
B. Affectation des artisans	A, E, C, F
C. Personnalisation des étapes	A, E
D. Appels de fonds	A, B, C, F, E
E. Création d'un chantier	A
F. Planification des étapes	A, E, C
G. Administration Base de Données	A

II) Classer les stories

1. Valeur Utilisateurs :



2. Taille et complexité :

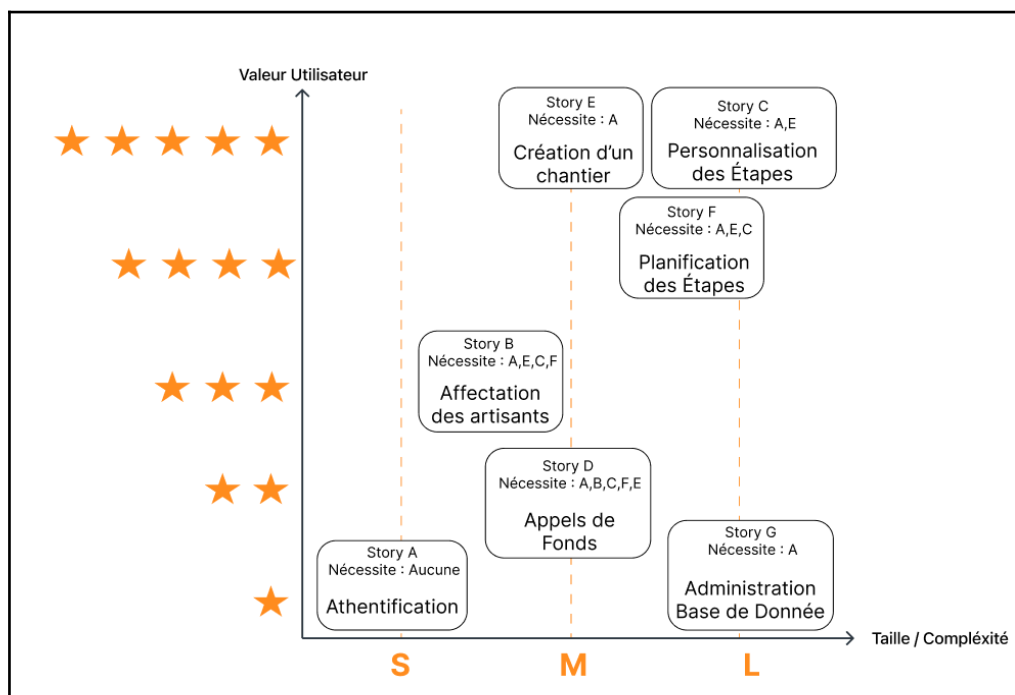

3. Classement des stories :

Rang	Story
1	A . Authentification Utilisateur
2	E. Création d'un chantier
3	C. Personnalisation des étapes
4	F. Planification des étapes
5	B. Affectation des artisans
6	D. Appels de fonds
7	G. Administration Base de Données

III) Tâches

1. Découpage et estimation du temps :

A . Authentification Utilisateur.

Tâche	Nombre d'heures estimées
IHM	4h
Base de Données	2h
Couche Métier	3h
Documentation	4h
Tests	5h
Debuggage	2h
Total	20h

E. Création d'un chantier.

Tâche	Nombre d'heures estimées
IHM	14h
Base de Données	2h
Couche Métier	12h
Documentation	7h
Tests	8h
Debuggage	5h
Total	48h

C. Personnalisation des étapes.

Tâche	Nombre d'heures estimées
IHM	13h
Base de Données	2h
Couche Métier	13h
Documentation	7h
Tests	8h
Debuggage	5h
Total	48h

F. Planification des étapes.

Tâche	Nombre d'heures estimées
IHM	13h
Base de Données	2h
Couche Métier	12h
Documentation	7h
Tests	7h
Debuggage	5h
Total	46h

B. Affectation des artisans.

Tâche	Nombre d'heures estimées
IHM	8h
Base de Données	2h
Couche Métier	8h
Documentation	6h
Tests	7h
Debuggage	4h
Total	35h

D. Appels de fonds.


Tâche	Nombre d'heures estimées
IHM	8h
Base de Données	2h
Couche Métier	8h
Documentation	5h
Tests	4h
Debuggage	2h
Total	29h

G. Administration Base de Données.

Tâche	Nombre d'heures estimées
IHM	5h
Base de Données	2h
Couche Métier	7h
Documentation	3h
Tests	2h
Debuggage	2h
Total	21h

2. Récapitulatif :

Story	Nombre d'heures estimées
A . Authentification Utilisateur	20h
E. Création d'un chantier	48h
C. Personnalisation des étapes	48h
F. Planification des étapes	46h
B. Affectation des artisans	35h
D. Appels de fonds	29h
G. Administration Base de Données	21h
Total	247h



IV) Sprints

1. Lots de tâches :

Sprint	Stories	Tâches	Durée	Vélocité
1	A	IHM	4h	7.5h
		Base de Données	2h	
		Couche métier	1.5h	
2	A	Couche métier	1.5h	45h
		Documentations	4h	
		Tests	5h	
		Debuggage	2h	
	E	IHM	14h	
		Base de Données	2h	
		Couche métier	12h	
		Documentations	4.5h	
3	E	Documentations	2.5h	45h
		Tests	8h	
		Debuggage	5h	
	C	IHM	13h	
		Base de Données	2h	
		Couche métier	13h	
		Documentations	1.5h	
	C	Documentations	5.5h	
		Tests	8h	
		Debuggage	5h	
	F	IHM	13h	

4		Base de Données	2h	155h
		Couche métier	12h	
		Documentations	7h	
		Tests	7h	
		Debuggage	5h	
	B	IHM	8h	
		Base de Données	2h	
		Couche métier	8h	
		Documentations	6h	
		Tests	7h	
		Debuggage	4h	
	D	IHM	8h	
		Base de Données	2h	
		Couche métier	8h	
		Documentations	5h	
		Tests	4h	
		Debuggage	2h	
	G	IHM	5h	
		Base de Données	2h	
		Couche métier	7h	
		Documentations	3h	
		Tests	2h	
		Debuggage	2h	

2. Calendrier :

Semaine	N°	Nombre de séances	Nombre d'heures à l'EDT	Nombre d'heures de travail	Sprint	mêlée et sprint review
lundi 3 novembre 2025	1	1	1.5h	7.5h	Sprint 1	Mêlée chaque jour Sprint review : 1ère séances
lundi 10 novembre 2025	2	3	4.5h	22.5h	Sprint 2	Mêlée chaque jour
lundi 17 novembre 2025	3	3	4.5h	22.5h		Mêlée chaque jour Sprint review : 3ème séances
lundi 24 novembre 2025	4	2	3h	15h	Sprint 3	Mêlée chaque jour
lundi 1 décembre 2025	5	4	6h	30h		Mêlée chaque jour Sprint review : 3e séances
lundi 8 décembre 2025	6	4	6h	30h	Sprint 4	Mêlée chaque jour
lundi 15 décembre 2025	Semaine de DS					
lundi 22 décembre 2025	Vacances					
lundi 29 décembre 2025						
lundi 5 janvier 2026	7	17	25h	125h	Sprint 4	Mêlée chaque jour Sprint review
			50.5h	252.5h		

3. Temps disponible par sprint :

Sprint	Semaines	Temps Disponible
1	03/11/2025	5 x 1.5h = 7.5h
2	10/11/2025 et 17/11/2025	5 x 6 x 1.5h = 45h
3	24/11/2025 et 01/12/2025	5 x 6 x 1.5h = 45h
4	8/12/2025 et 05/01/2026	5 x 21 x 1.5h = 155h

4. Stories et livrables

Sprint	Semaines	Temps disponible	Stories	Livrables
1	03/11/2025	5 x 1.5h = 7.5h	A. Authentification Utilisateur (7.5/20h)	A. Authentification Utilisateur (non complet)
2	10/11/2025 et 17/11/2025	5 x 6 x 1.5h = 45h	A. Authentification Utilisateur (12.5/20h) E. Création d'un chantier (32.5/48h)	A. Authentification utilisateur
3	24/11/2025 et 01/12/2025	5 x 6 x 1.5h = 45h	E. Création d'un chantier (15.5/48h) C. Personnalisation des étapes (29.5/48h)	E. Création d'un chantier
4	8/12/2025 et 05/01/2026	5 x 21 x 1.5h = 155h	C. Personnalisation des étapes (19.5/48h) F. Planification des étapes (46/46h) B. Affectation des artisans (35/35h) D. Appels de fonds (29/29h) G. Administration Base de Données (21/21h)	C. Personnalisation des étapes F. Planification des étapes B. Affectation des artisans D. Appels de fonds
